


Baier-OA

Terminausführung: 01.–02.11.18

- Vollsperrung Kreuzungsbereich Eichenstr. / Platanenstr. Mfg.
- Ausfahrt Eichenstr. 1 -22 alleinig über Theodor-Heuss- Str.
- Die Entfernung Absperpfosten im Wendehammerbereich Eichenstr. / Theodor-Heuss-Str. erfolgt durch den Bauhof Mainhausen
- Anschreiben Anwohner über Vollsperrung durch Fa. Deutsche Glasfaser/Artemis IST rechtzeitig im Vorfeld

VZ Plan Vollsperrung Kreuzungsbereich Eichenstr. / Platanenstr., OT Mainflingen am 01.-02.11.2018

Fa. ARTEMIS ITS – Hr. Kallis mobil 0172-6611127

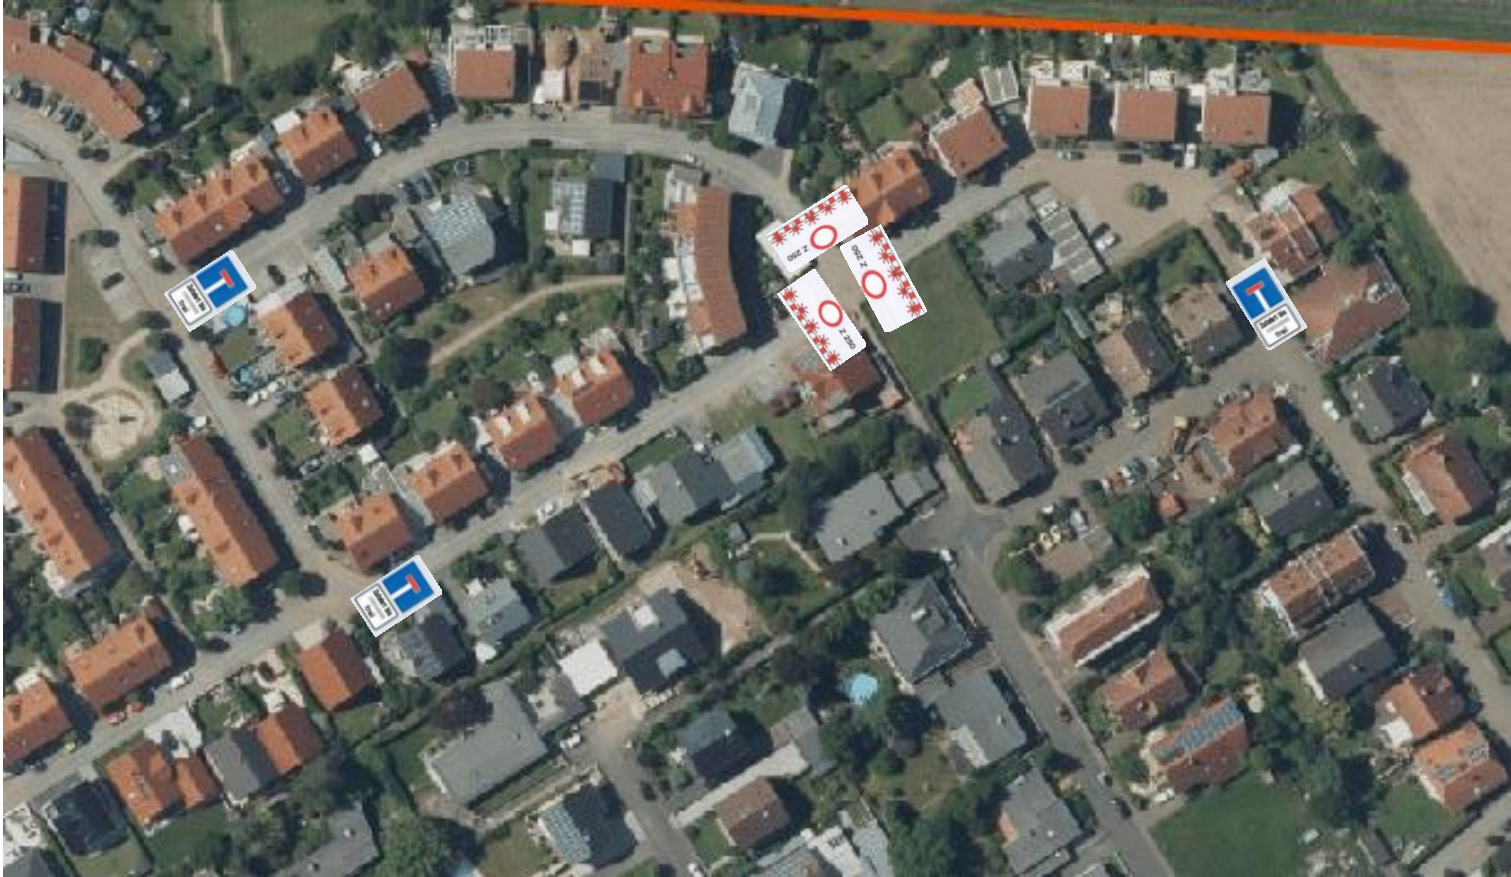

B171/18 Vollsperrung
analog Regelplan BI/17

Vollsperrung mit Abperrschranke
VZ 600-30 StVO i.V.m. VZ 250
StVO; Beleuchtung rot / Dauerlicht
min. 5 Stück

Sackgassenregelung mit VZ 357
StVO i.V.m. Zusatz 1028-32 StVO
(Anlieger bis Baustelle frei)

Vollsperrung:

Anfang und Ende der Arbeitsstelle:

Rechtwinklige Querabspernung (Abbildung)
Abperrschranke: H = 250 mm
Warnleuchten: WL 1 - rot / Dauerlicht, min. 5 Stck.
Querabstand max. 1 m

Längsabspernung zum Gehweg:

Abperrschranke: H = min. 100 mm
Warnleuchten: WL 2 oder WL 8 - gelb
Längsabstand: max. 10 m
Ggf. zusätzlich Tastleisten

Aufstellhöhe der Verkehrszeichen (Unterkante):

Auf Radwegen min.	2,20 m
Auf Gehwegen min.	2,00 m
Auf Seitenstreifen min.	1,50 m

Errichtung HVZ volle 3 Werktage im
Voraus. (VZ 283-10; 283-20)

Ausfahrt Eichenstr. 1 -22 erfolgt
über Theodor-Heuss- Str.

Entfernung der Absperrrpfosten im
Wendehammerbereich Eichenstr./
Theodor-Heuss-Str. erfolgt durch
den Bauhof Mainhausen.

Alle Anwohner sind rechtzeitig im
Vorfeld schriftlich über die
Vollsperrung und die geänderte
Anfahrbarkeit zu informieren.

Ausführungstermin: 01.-02.11.18

Stand 26.10.18 – Baier/OA

Anfahrtsplan Rettungs- und Einsatzkräfte

Achtung Eichenstr. HN 5, 9, 13, 15, 17 über Zufahrt Ginkgoring anfahren.

HN 1,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22 über Theodor-Heuss-Str. anfahren.

